Załącznik nr 6

ZAKŁAD KOMINIARSKI
Paweł Starmach

Stare Kurowo dnia 14 sierpnia 2020 r.

Zezwolenie - Opinia
Nr 85/2020

Na zainstalowanie : Kotła C.O. gazowego oraz wentylacji grawitacyjnej w kuchni

Miejscowość : Gorzów Wlkp.

Ulica : Waryńskiego 16/1

Właściciel : Wspólnota mieszkaniowa nr 2272

Użytkownik : j/w

UWAGI:

1. Zabrania się stosowania przy kanałach kominowych urządzeń elektrycznych typu pochłaniacz, wentylator elektryczny.
2. W kratkach wentylacyjnych nie instalować żaluzji zamykających .
3. Kanał kominowy odprowadzający spaliny z kotła C.O. gaz został zabezpieczony wkładem kominowym KO .
4. W pomieszczaniu kuchni należy wykonać nawiew powietrza z zewnątrz (kratkę nawiewną)

Do odprowadzania spalin z kotła C.O. gazowego przeznacza się kanał kominowy, oznaczony w szkicu-rysunku na odwrocie .

OPINIA MA OKRES WAŻNOŚCI 6 (SZEŚĆ) MIESIĘCY

Zakład Kominiarski Paweł Starmach ul. Wiejska 3, 66-540 Stare Kurowo
Tel. 95 76 15 459 , 608 111 887 , e-mail: zakład.kominiarski@op.pl
NIP: 281-002-55-24 ; REGON : 080508288
www.pstarmach.pl

Załącznik nr 6

Szkic orientacyjny : Waryńskiego 16/1(kuchnia)

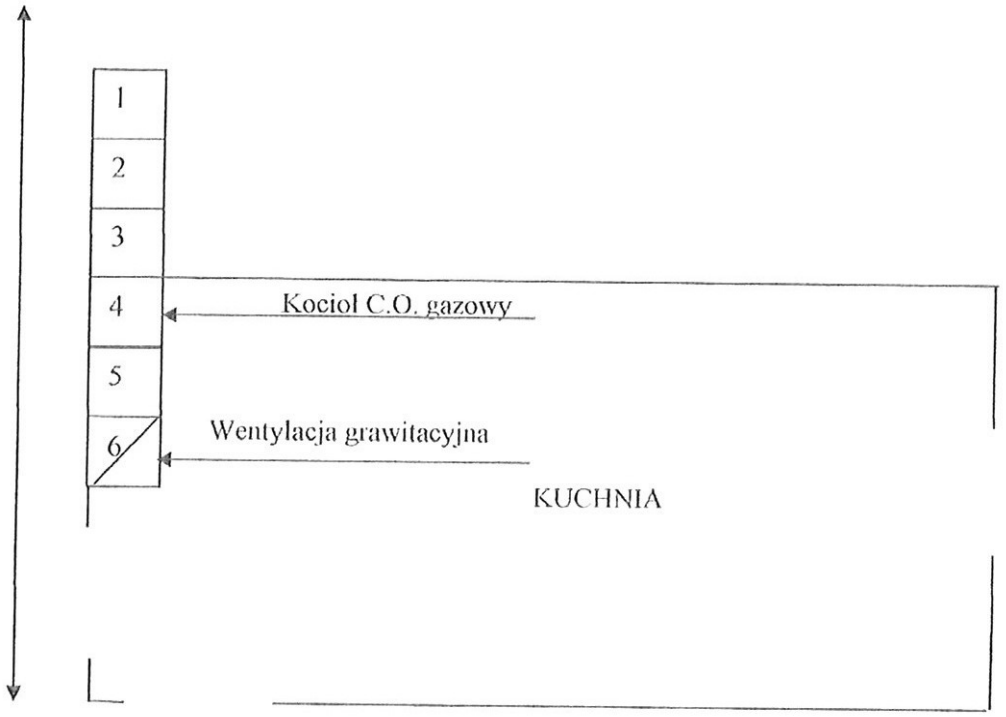

- Konstrukcja kanałów kominowych : Wentylacja : murowana -cegła pełna – kanał spalinowy nr 3 został zabezpieczony wkładem KO

ZAKŁAD KOMINIARSKI
Paweł Starmach
ul. Wojska 3
66-540 Stare Kurowo
NIP 2610025624, tel. 608 111 887
Dypl. Nr 304/10

UWAGA: Potwierdzenie prawidłowego podłączenia do wskazanego przewodu kominowego , przez Mistrza Kominiarskiego.

dnia : ……

……

Załącznik nr 7

ZAKŁAD KOMINIARSKI
Paweł Starmach

Stare Kurowo dnia 14 sierpnia 2020 r.

Zezwolenie - Opinia
Nr 88/2020

Na zainstalowanie : Wentylacji grawitacyjnej w kuchni

Miejscowość : Gorzów Wlkp.

Ulica : Waryńskiego 16/2

Właściciel : Wspólnota mieszkaniowa nr 2272

Użytkownik : j/w

UWAGI:

1. Zabrania się stosowania przy kanałach kominowych urządzeń elektrycznych typu pochłaniacz, wentylator elektryczny.
2. W kratkach wentylacyjnych nie instalować żaluzji zamykających .
3. **Kratkę wentylacyjną w kuchni należy przełączyć do kanału kominowego nr 2 – aktualnie zainstalowana w kanale kominowym nr 1**

Do odprowadzania powietrza z kratki wentylacyjnej przeznacza się kanał kominowy, oznaczony w szkicu-rysunku na odwrocie .

OPINIA MA OKRES WAŻNOŚCI 6 (SZEŚĆ) MIESIĘCY

Zakład Kominiarski Paweł Starmach ul. Wiejska 3, 66-540 Stare Kurowo
Tel. 95 76 15 459 , 608 111 887 , e-mail: zaklad.kominiarski@op.pl
NIP: 281-002-55-24 ; REGON : 080508288
www.pstarmach.pl

Załącznik nr 7

Szkic orientacyjny : Waryńskiego 16/8 (kuchnia)

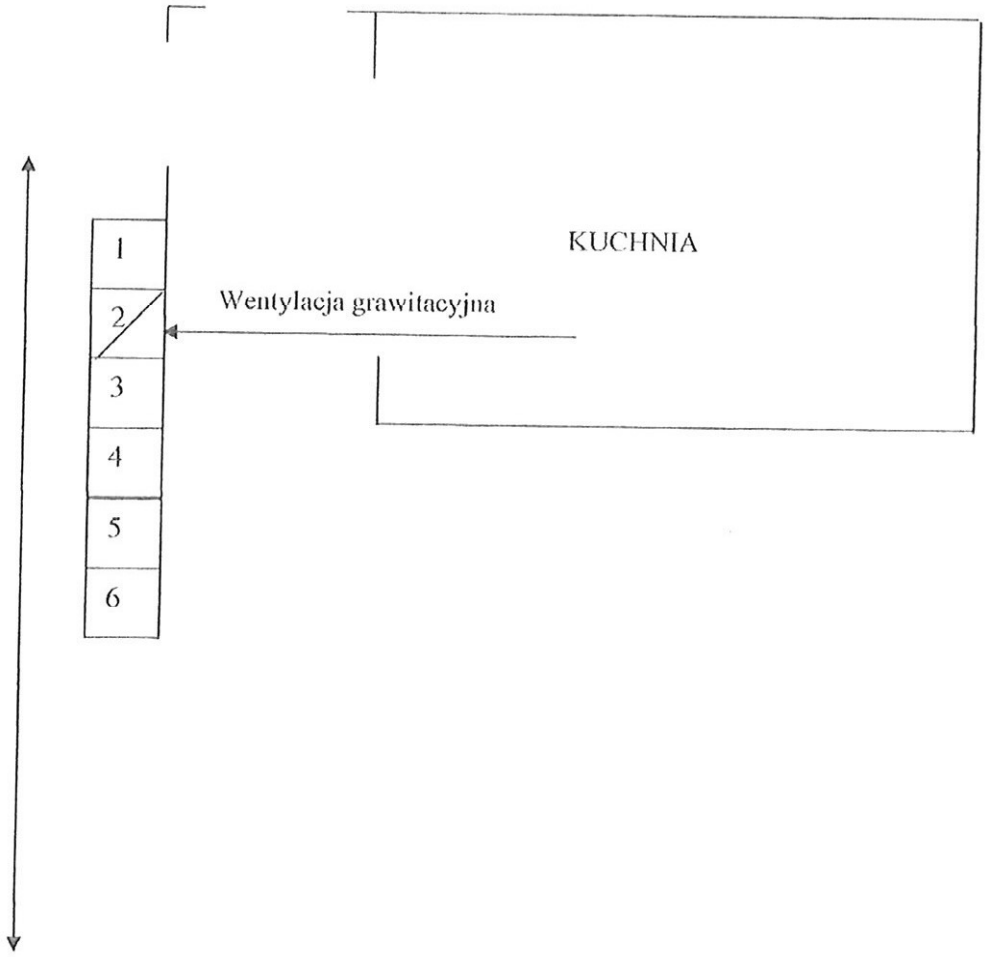

- Konstrukcja kanałów kominowych : Wentylacja : murowana -cegła pełna

ZAKŁAD KOMINIARSKI
Paweł Starmach
ul. Wiejska 3
66-540 Stare Kurowo
NIP 2810025524, tel. 608 111 887
Dypl. Nr 304/10

UWAGA: Potwierdzenie prawidłowego podłączenia do wskazanego przewodu kominowego , przez Mistrza Kominiarskiego.

dnia : ……

……

Załącznik nr 8

ZAKŁAD KOMINIARSKI
Paweł Starmach

Stare Kurowo dnia 14 sierpnia 2020 r.

Zezwolenie - Opinia
Nr 89/2020

Na zainstalowanie : Wentylacji grawitacyjnej w kuchni

Miejscowość : Gorzów Wlkp.

Ulica : Waryńskiego 16/3

Właściciel : Wspólnota mieszkaniowa nr 2272

Użytkownik : j/w

UWAGI:

1. Zabrania się stosowania przy kanałach kominowych urządzeń elektrycznych typu pochłaniacz, wentylator elektryczny.
2. W kratkach wentylacyjnych nie instalować żaluzji zamykających .

Do odprowadzania powietrza z kratki wentylacyjnej przeznacza się kanał kominowy, oznaczony w szkicu-rysunku na odwrocie .

OPINIA MA OKRES WAŻNOŚCI 6 (SZEŚĆ) MIESIĘCY

Zakład Kominiarski Paweł Starmach ul. Wiejska 3, 66-540 Stare Kurowo
Tel. 95 76 15 459 , 608 111 887 , e-mail: zaklad.kominiarski@op.pl
NIP: 281-002-55-24 ; REGON : 080508288
www.pstarmach.pl

Załącznik nr 8

Szkic orientacyjny : Waryńskiego 16/3 (kuchnia)

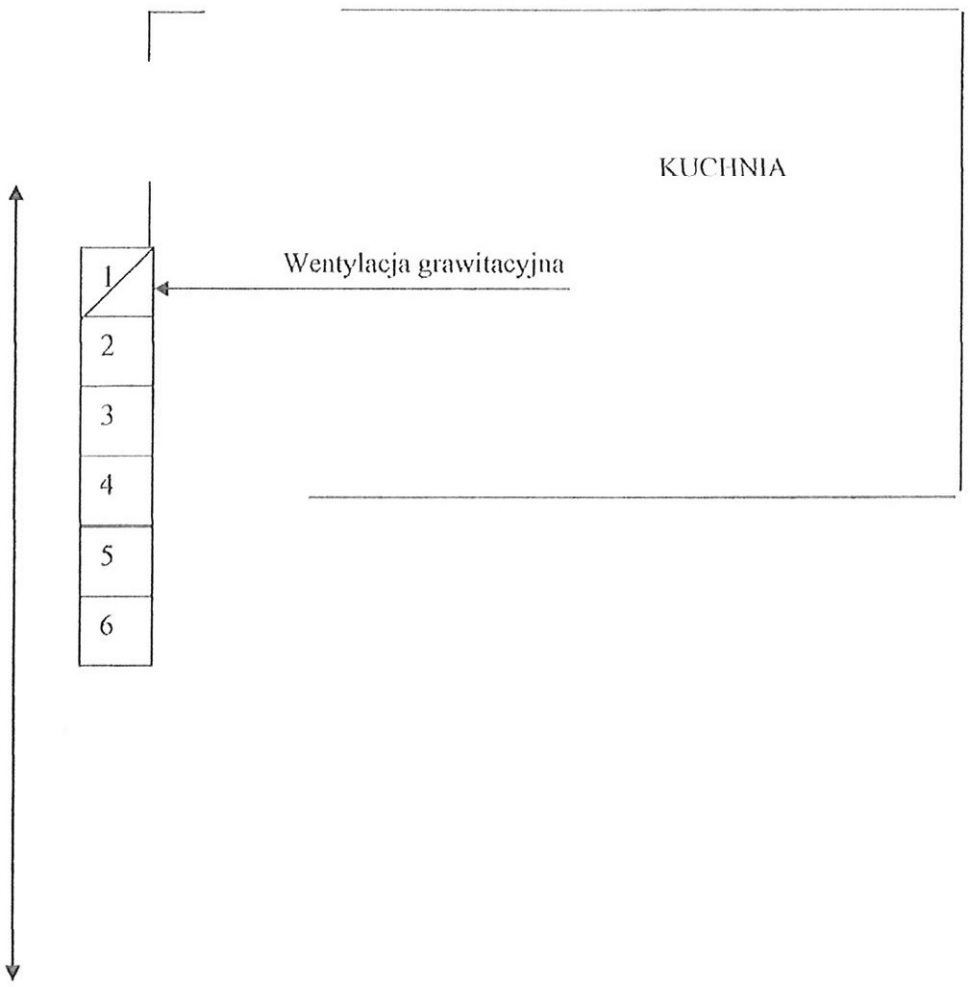

- Konstrukcja kanałów kominowych : Wentylacja : murowana -cegła pełna

ZAKŁAD KOMINIARSKI
Paweł Starmach
ul. Wiejska 3
66-540 Stare Kurowo
NIP 2610025524, tel: 608.111 887
Dypl. Nr 304/10

UWAGA: Potwierdzenie prawidłowego podłączenia do wskazanego przewodu kominowego , przez Mistrza Kominiarskiego.

dnia : ....

Załącznik nr 9

ZAKŁAD KOMINIARSKI

Paweł Starmach

Stare Kurowo dnia 14 sierpnia 2020 r.

Zezwolenie - Opinia
Nr 86/2020

Na zainstalowanie : Wentylacji grawitacyjnej w kuchni

ZAKŁAD KOMINIARSKI
Paweł Starmach
ul. Wiejska 3
66-540 Stare Kurowo
NIP 2810025524, tel. 608 111 887
Dypl. Nr 304/10

Miejscowość	:	Gorzów Wlkp.
Ulica	:	Waryńskiego 16/14
Właściciel	:	Wspólnota mieszkaniowa nr 2272
Użytkownik	:	j/w

UWAGI:

1. Zabrania się stosowania przy kanałach kominowych urządzeń elektrycznych typu pochłaniacz, wentylator elektryczny.
2. W kratkach wentylacyjnych nie instalować żaluzji zamykających .

Do odprowadzania powietrza z kratki wentylacyjnej przeznacza się kanał kominowy, oznaczony w szkicu-rysunku na odwrocie .

OPINIA MA OKRES WAŻNOŚCI 6 (SZEŚĆ) MIESIĘCY

- Konstrukcja kanałów kominowych : Wentylacja : murowana -cegła pełna

Załącznik nr 9

Szkic orientacyjny : Waryńskiego 16/~~5~~4(kuchnia)

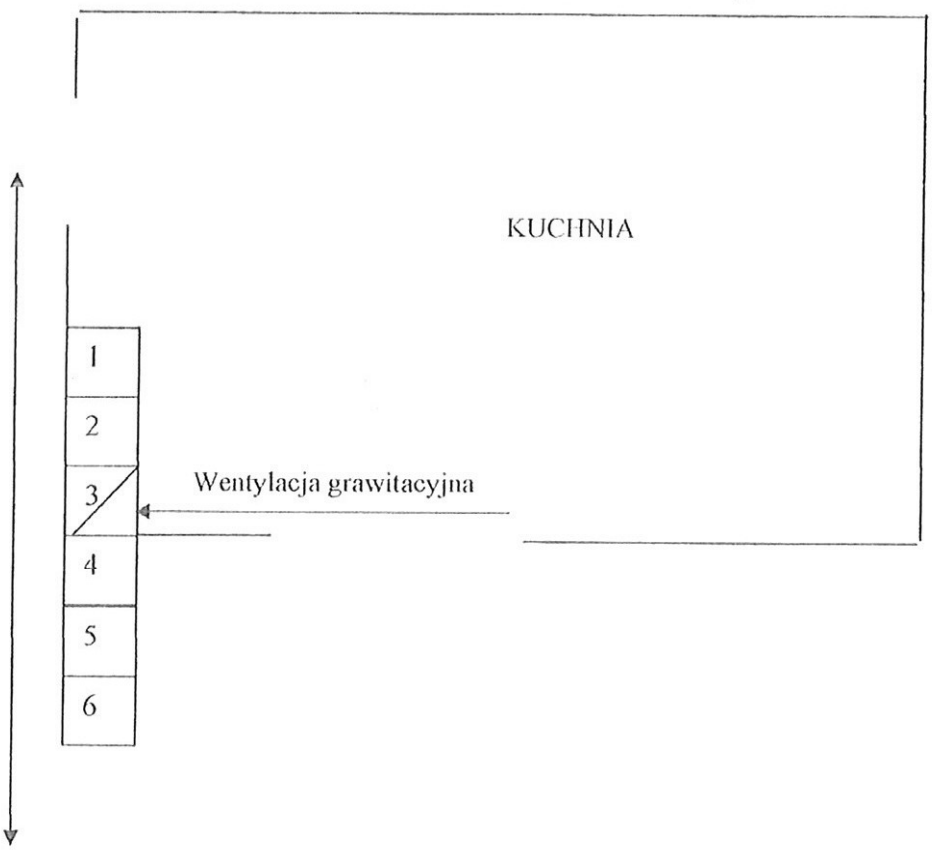

ZAKŁAD KOMINIARSKI
Paweł Stärmach
ul. Wiejska 3
66-540 Stare Kurowo
NIP 2610025524, tel. 608 111 887
Dypl. Nr 304/10

UWAGA: Potwierdzenie prawidłowego podłączenia do wskazanego przewodu kominowego , przez Mistrza Kominiarskiego.

dnia : …….. ……

Załącznik nr 10

ZAKŁAD KOMINIARSKI
Paweł Starmach

Stare Kurowo dnia 14 sierpnia 2020 r.

Zezwolenie - Opinia
Nr 90/2020

Na zainstalowanie : Wentylacji grawitacyjnej w kuchni

Miejscowość : Gorzów Wlkp.

Ulica : Waryńskiego 16/6

Właściciel : Wspólnota mieszkaniowa nr 2272

Użytkownik : j/w

UWAGI:

1. Zabrania się stosowania przy kanałach kominowych urządzeń elektrycznych typu pochłaniacz, wentylator elektryczny.
2. W kratkach wentylacyjnych nie instalować żaluzji zamykających .
3. **Kratkę wentylacyjną w kuchni należy przełączyć do kanału kominowego nr 3 – aktualnie zainstalowana w kanale kominowym nr 7**

Do odprowadzania powietrza z kratki wentylacyjnej przeznacza się kanał kominowy, oznaczony w szkicu-rysunku na odwrocie .

OPINIA MA OKRES WAŻNOŚCI 6 (SZEŚĆ) MIESIĘCY

Zakład Kominiarski Paweł Starmach ul. Wiejska 3, 66-540 Stare Kurowo
Tel. 95 76 15 459 , 608 111 887 , e-mail: zakład.kominiarski@op.pl
NIP: 281-002-55-24 ; REGON : 080508288
www.pstarmach.pl

Załącznik nr 10

Szkic orientacyjny : Waryńskiego 16/6 (kuchnia)

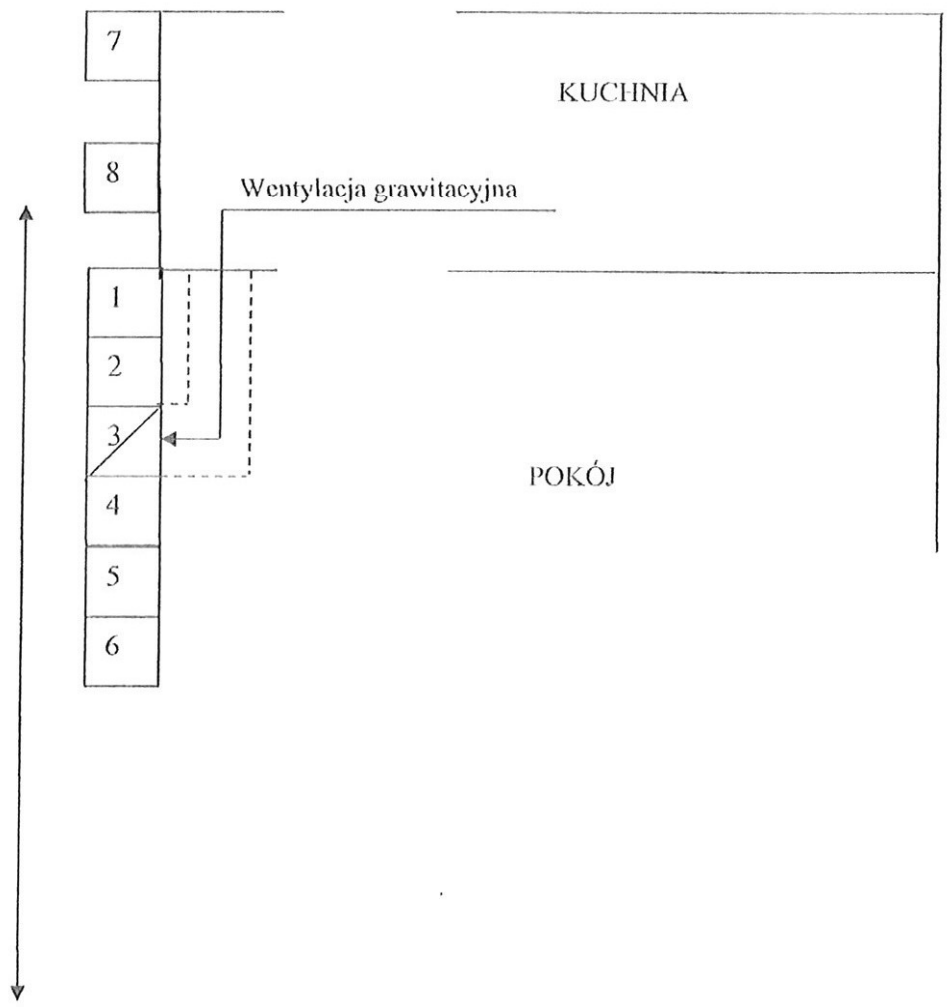

- Konstrukcja kanałów kominowych : Wentylacja : murowana -cegła pełna

ZAKŁAD KOMINIARSKI
Paweł Starmach
ul. Wiejska 3
66-540 Stare Kurowo
NIP 2810025524, tel. 608 111 887
Dnia: 30.7.10
Sytł. Nr 30/10

UWAGA: Potwierdzenie prawidłowego podłączenia do wskazanego przewodu kominowego , przez Mistrza Kominiarskiego.

dnia : ....

Załącznik nr 11

ZAKŁAD KOMINIARSKI
Paweł Starmach

Stare Kurowo dnia 14 sierpnia 2020 r.

Zezwolenie - Opinia
Nr 91/2020

Na zainstalowanie : Wentylacji grawitacyjnej w kuchni

Miejscowość : Gorzów Wlkp.

Ulica : Waryńskiego 16/7

Właściciel : Wspólnota mieszkaniowa nr 2272

Użytkownik : j/w

UWAGI:

1. Zabrania się stosowania przy kanałach kominowych urządzeń elektrycznych typu pochłaniacz, wentylator elektryczny.
2. W kratkach wentylacyjnych nie instalować żaluzji zamykających .

Do odprowadzania powietrza z kratki wentylacyjnej przeznacza się kanał kominowy, oznaczony w szkicu-rysunku na odwrocie .

OPINIA MA OKRES WAŻNOŚCI 6 (SZEŚĆ) MIESIĘCY

Zakład Kominiarski Paweł Starmach ul. Wiejska 3, 66-540 Stare Kurowo
Tel. 95 76 15 459 , 608 111 887 , e-mail: zaklad.kominiarski@op.pl
NIP: 281-002-55-24 ; REGON : 080508288
www.pstarmach.pl

Załącznik nr ...11...

Szkic orientacyjny : Waryńskiego 16/7 (kuchnia)

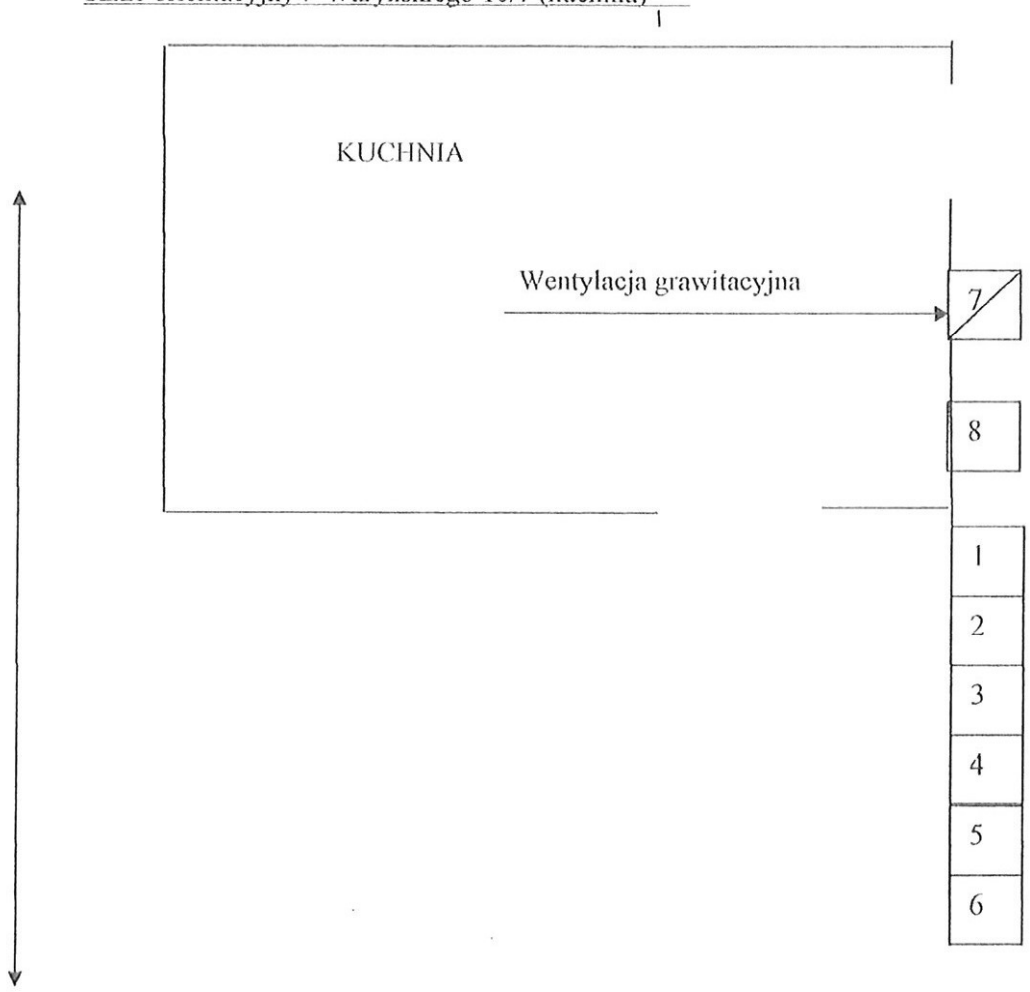

- Konstrukcja kanałów kominowych : Wentylacja : murowana -cegła pełna

ZAKŁAD KOMINIARSKI
Dariusz Sikorski
ul. Wiejska 4
66-540 Skąpe Kunowo
NIP 2810025594, tel. 608 177 801
Dypl. Nr 304/10

UWAGA: Potwierdzenie prawidłowego podłączenia do wskazanego przewodu kominowego , przez Mistrza Kominiarskiego.

dnia : …….. ……

Załącznik nr 12

ZAKŁAD KOMINIARSKI
Paweł Starmach

Stare Kurowo dnia 14 sierpnia 2020 r.

Zezwolenie - Opinia
Nr 87/2020

Na zainstalowanie : Wentylacji grawitacyjnej w kuchni

Miejscowość : Gorzów Wlkp.

Ulica : Waryńskiego 16/8

Właściciel : Wspólnota mieszkaniowa nr 2272

Użytkownik : j/w

UWAGI:

1. Zabrania się stosowania przy kanałach kominowych urządzeń elektrycznych typu pochłaniacz, wentylator elektryczny.
2. W kratkach wentylacyjnych nie instalować żaluzji zamykających .
3. **Kratkę wentylacyjną w kuchni należy przełączyć do kanału kominowego nr 1 – aktualnie zainstalowana w kanale kominowym nr 6**

Do odprowadzania powietrza z kratki wentylacyjnej przeznacza się kanał kominowy, oznaczony w szkicu-rysunku na odwrocie .

OPINIA MA OKRES WAŻNOŚCI 6 (SZEŚĆ) MIESIĘCY

Zakład Kominiarski Paweł Starmach ul. Wiejska 3, 66-540 Stare Kurowo
Tel. 95 76 15 459 , 608 111 887 , e-mail: zaklad.kominiarski@op.pl
NIP: 281-002-55-24 ; REGON : 080508288
www.pstarmach.pl

Szkic orientacyjny : Waryńskiego 16/8 (kuchnia)

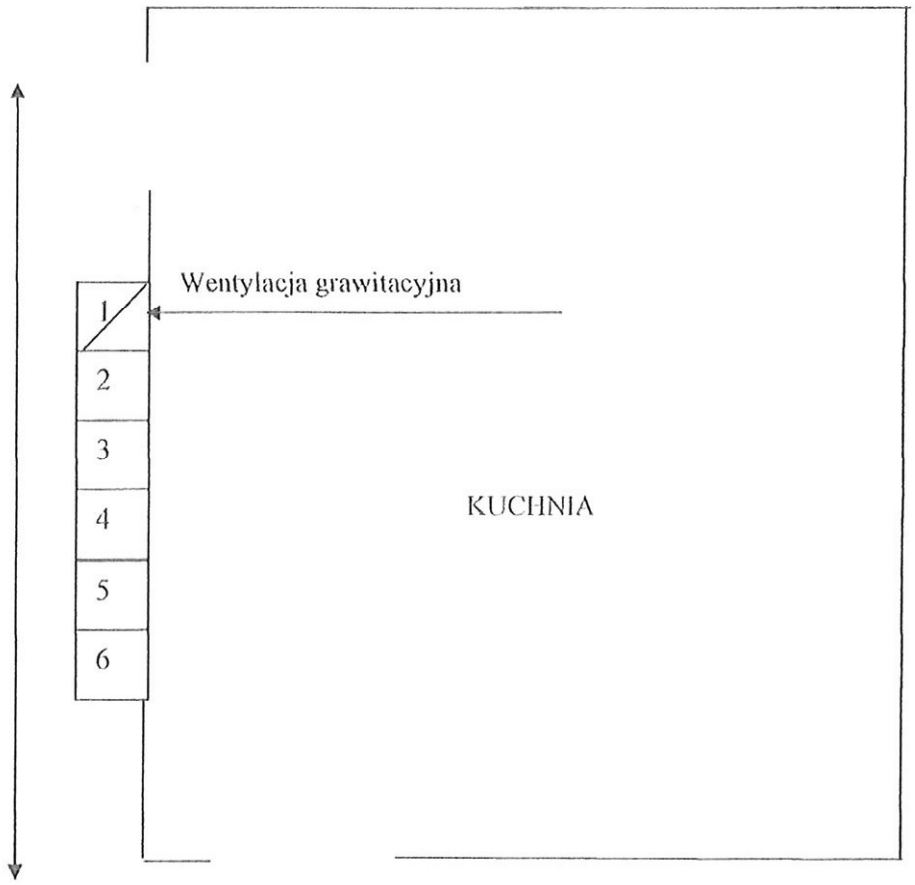

- Konstrukcja kanałów kominowych : Wentylacja : murowana -cegła pełna

ZAKŁAD KOMINIARSKI
Paweł Starmach
ul. Wielka 3
66-540 Stara Kurowo
NIP 9810025824, tel.: 608-111-887
Dypl. Nr 304/10

UWAGA: Potwierdzenie prawidłowego podłączenia do wskazanego przewodu kominowego , przez Mistrza Kominiarskiego.

dnia : ....

Załącznik nr 13

POLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
Żeglarska 16, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 957365642, fax 957365608

Gazownia w Gorzowie Wielkopolskim
gen. Władysława Sikorskiego 73, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 736 56 00, faks 95 736 56 08
gazownia.gorzow.wielkopolski@psgaz.pl

W/ znak:
N/ znak: PSGW900/DT/GZWW901-6140-100359/20

Wspólnota Mieszkaniowa 2272
UL. Waryńskiego 16 w Gorzowie Wielkopolskim
Ludwika Waryńskiego 16
66-400 Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski, 24-09-2020

NR PSGW900/DT/GZWW901-6140-100359/20

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. **lubuskie,** gm. **Gorzów Wielkopolski,** m. **Gorzów Wielkopolski,** ul. **Ludwika Waryńskiego 16**

W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 21.09.2020 r. informujemy, iż wyrażamy zgodę na modernizację instalacji gazowej w budynku nr 16 (dz. nr 43/1) przy ul. Ludwika Waryńskiego w m. Gorzów Wielkopolski polegającej na wymianie instalacji gazowej od istniejącego kurka głównego zlokalizowanego na ścianie budynku. Podejścia pod układy pomiarowe montować na zewnątrz lokali mieszkalnych, wyłącznie za pomocą mono złączy o rozstawie 130 mm, w szafkach ochronnych, tak aby spód gazomierza był nie wyżej niż 1,80 m od poziomu podłogi. Na każdym pionie należy zamontować zawór odcinający, umożliwiający odcięcie części instalacji gazowej w budynku. Prace na instalacji należy wykonać własnym kosztem i staraniem. Przebudowa może odbyć się wyłącznie za zgodą właścicieli lub współwłaścicieli w/w budynku.

Urządzenia gazowe zamontowane w budynku:

- kuchenka gazowa o mocy 11 kW	- 6 szt.
- kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.) o mocy 24 kW	- 3 szt.
- ilość układów pomiarowych z gazomierzami G 1,6	- 3 szt.
- ilość układów pomiarowych z gazomierzami G 4	- 3 szt.

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych należy:
- opracować projekt budowlany obejmujący zakres przebudowy wykonany przez uprawnionego projektanta, zgodnie z obowiązującymi przepisami - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 – rozdział nr 7),
- uzyskać stosowne decyzje - zgodnie z procedurą obowiązującej Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami.

Po wykonaniu prac należy:
- wykonać próbę szczelności instalacji gazowej,
- dostarczyć do Gazowni w Gorzowie Wielkopolskim wypełnione "Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym" odcinka od kurka głównego do zaworów przed układami pomiarowymi,
- poinformować odbiorców o konieczności dostarczenia wypełnionego „Zgłoszenia gotowości instalacji gazowej

Załącznik nr 13

POLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

do napełnienia paliwem gazowym".

Informujemy, że montaż, demontaż, oplombowanie układów pomiarowych związane z remontem lub wymianą instalacji gazowej są usługami odpłatnymi wykonywanymi na zlecenie odbiorcy gazu zgodnie z Taryfą PSG Sp. z o.o.

Sprawę prowadzi: Izabela Świątkowska tel. 957 365 688

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gazowni w Gorzowie Wlkp.
Robert Kiepura
